Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		**Initialisierung**	**17 Tage**	**Mit 15.03.17**	**Don 06.04.17**		
2		Kick-Off-Meeting	0 Tage	Mit 15.03.17	Mit 15.03.17		Elias Riedel;Lukas
3		Gruppenfindung und Erarbeitung des	10 Tage	Mit 15.03.17	Die 28.03.17	2	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae Ababei;Siegfried
4		Annahme des Projektvorschlags	0 Tage	Mit 29.03.17	Mit 29.03.17	3	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae
5		Anforderungsanal	7 Tage	Mit 29.03.17	Don 06.04.17	4	Elias Riedel;Lukas
6		**Planung**	**14 Tage**	**Fre 07.04.17**	**Don 27.04.17**		
7		Frameworktesting	8 Tage	Fre 07.04.17	Die 18.04.17	5	Elias Riedel;Lukas
8		Design des Gesamtprojekts	6 Tage	Mit 19.04.17	Mit 26.04.17	7	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae
9		Architektur- und Datenmodell	0 Tage	Don 27.04.17	Don 27.04.17	8	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae
10		**Implementierung**	**51 Tage**	**Don 27.04.17**	**Don 06.07.17**		
11		Kommunikation mit Vuforia	9 Tage	Don 27.04.17	Die 09.05.17	9	Nicolae Ababei;Simon
12		Serversoftware festlegen und Hardware	9 Tage	Don 27.04.17	Die 09.05.17		Lukas Ziegler
13		erste lauffähige Anwendungsdem	0 Tage	Mit 10.05.17	Mit 10.05.17	11	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae
14		Datenbankanbind mit CRUD	11 Tage	Mit 10.05.17	Mit 24.05.17		Lukas Ziegler;Simon
15		CRUD Demo	0 Tage	Don 25.05.17	Don 25.05.17	14	Elias Riedel;Lukas
16		Webinterface	30 Tage	Don 25.05.17	Mit 05.07.17	14	Elias Riedel;Simon
17		Content-Manager	30 Tage	Don 25.05.17	Mit 05.07.17	14	Simon Janssen;Eli
18		lauffähiger Hardwareserver	11 Tage	Mit 10.05.17	Mit 24.05.17	12	Lukas Ziegler;Simon
19		GUI-Implementier	20 Tage	Mit 10.05.17	Die 06.06.17	13	Nicolae Ababei;Si
20		Anwender Demo	0 Tage	Mit 07.06.17	Mit 07.06.17	19	Elias Riedel;Lukas
21		Mapsystem	16 Tage	Mit 07.06.17	Mit 28.06.17		Elias Riedel;Simon
22		History integriere	16 Tage	Mit 07.06.17	Mit 28.06.17	20	Nicolae Ababei;Si
23		Textrendering verbessern	16 Tage	Mit 07.06.17	Mit 28.06.17	20	Nicolae Ababei;Siegfried
24		Release Candidate	0 Tage	Don 29.06.17	Don 29.06.17	21;22;23	Elias Riedel;Lukas
25		Testing und Bugfixing	6 Tage	Don 29.06.17	Don 06.07.17	24	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae
26		**Projektabschluss**	**5 Tage**	**Fre 07.07.17**	**Fre 14.07.17**		
27		Abgabe der Projektdokument	0 Tage	Fre 07.07.17	Fre 07.07.17	25;16;17	Lukas Ziegler;Siegfried
28		Vorbereitung der Präsentation	5 Tage	Fre 07.07.17	Don 13.07.17	27	Elias Riedel;Lukas Ziegler;Nicolae
29		Abschlusspräsenta	0 Tage	Fre 14.07.17	Fre 14.07.17	28	Elias Riedel;Lukas

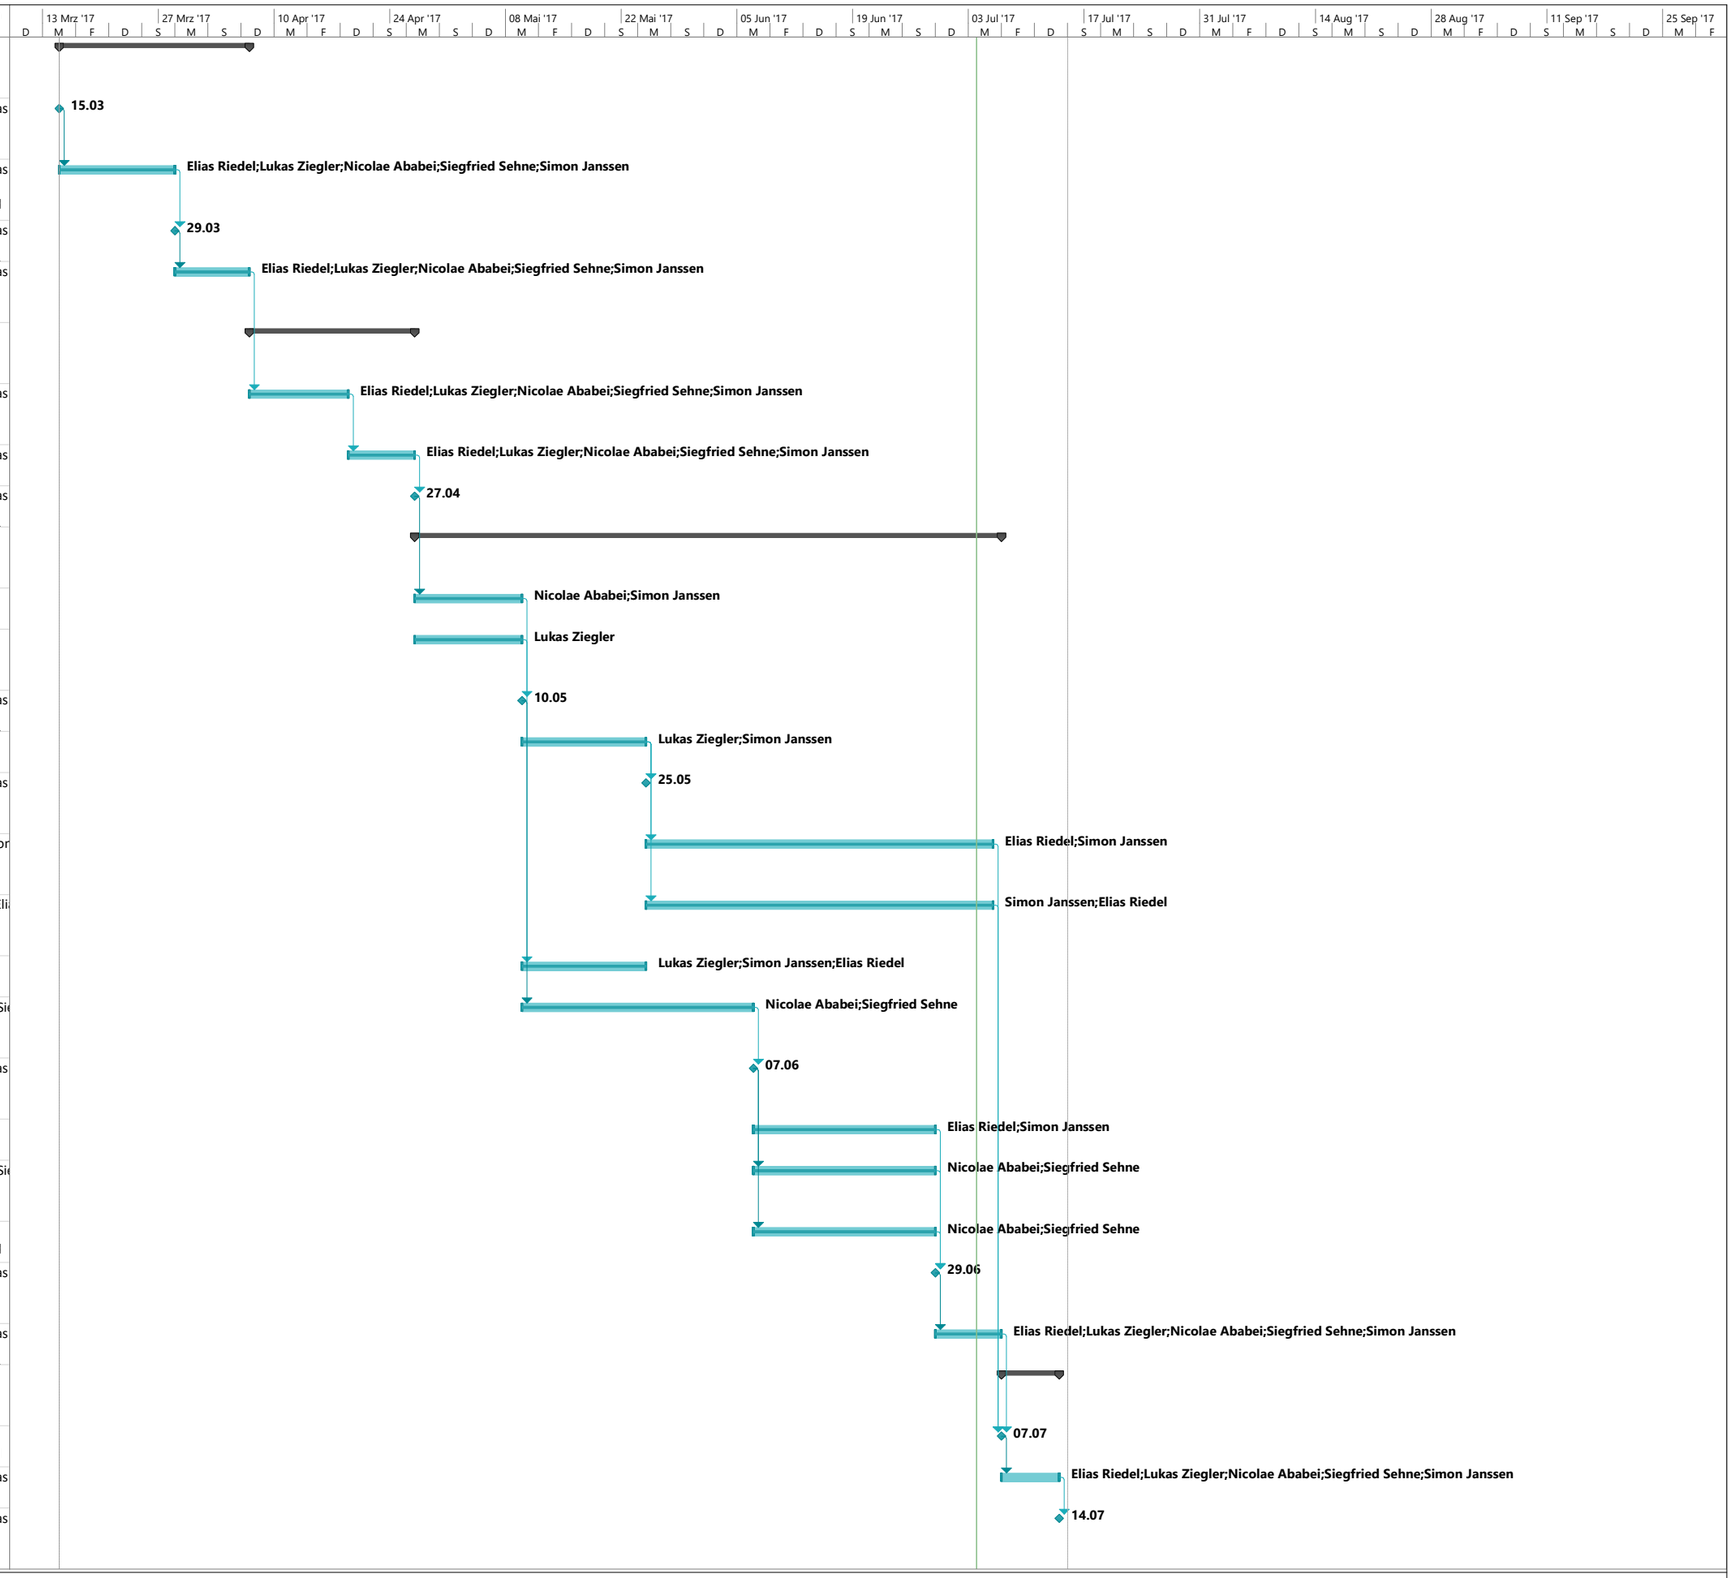

Projekt: udvide_project_ressou
Datum: Die 04.07.17

Vorgang · Sammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Nur Dauer · Nur Anfang · Externer Meilenstein · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Projektsammelvorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Ende · Stichtag
Meilenstein · Inaktiver Vorgang · Manueller Vorgang · Manueller Sammelvorgang · Externe Vorgänge · In Arbeit
